

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 1/2021

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Objednávateľ

Názov: Trnavská arcidiecézna charita
Adresa: Hlavná 43, 917 01 Trnava
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.
Číslo účtu: SK71 7500 0000 0040 0829 7855
IČO: 35602619
IČ DPH: neplatca DPH
Konajúci: Ing. Miroslav Dzurech, riaditeľ

(ďalej ako objednávateľ vo všetkých gramatických tvaroch)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: DAG SLOVAKIA, a. s.
Sídlo: Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Príslušný register: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 10421/P
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu: SK45 0200 0000 0028 6331 2455
IČO: 44 886 021
IČ DPH: SK 2022857749
Konajúci: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

(ďalej ako zhotoviteľ vo všetkých gramatických tvaroch)

uzatvorili tento Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo

(ďalej len „Dodatok č. 4“ a „Zmluva“ vo všetkých gramatických tvaroch).

Zmluvné strany dňa 14.06.2021 uzatvorili Zmluvu ako výsledok procesu verejného obstarávania za účelom realizácie diela „Centrum pomoci človeku Trnava“. V zmysle bodu 13.2 Zmluvy „zmeniť alebo doplniť túto Zmluvu je možné len v súlade s § 18 ZVO na základe písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán“. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.03.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve v súlade s §18 ods. 3 písm. a) ZVO, nakoľko hodnota všetkých zmien bola nižšia ako finančný limit podľa §5 ods. 2 ZVO a zároveň nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej zmluvy. Dodatkom došlo k navýšeniu ceny za dielo, z dôvodu potreby realizácie prác navyiac, k upresneniu osôb splnomocnených na zastupovanie vo veciach technických a vo veciach vykonávania diela pre účely tejto zmluvy a tiež doplneniu zoznamu subdodávateľov. Počas realizácie diela po uzatvorení Zmluvy a Dodatku č. 1 k Zmluve nastali okolnosti, z ktorých vyplynula potreba realizácie ďalších prác navyiac, ktorých vykonanie bolo potrebné na riadne ukončenie a odovzdanie diela. Z toho dôvodu bol dňa 07.12.2022 uzatvorený Dodatok č. 2 k Zmluve v súlade s §18 ods. 1 písm. b) ZVO. Dôvodom na uzatvorenie Dodatku č. 3 k Zmluve boli nepredvídateľné okolností v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) ZVO a to vysoký nárast cien stavebných materiálov, zapríčinený pandémiou ochorenia COVID-19 a vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou.



Dôvodom na uzatvorenie Dodatku č. 4 je potreba predĺženia lehoty realizácie diela z nasledujúcich dôvodov:

- 1) realizácia prác navyiac, ktoré boli nevyhnutné k realizovaniu diela a nenachádzali sa v pôvodnej zmluve; realizáciou prác navyiac došlo k navýšeniu celkovej ceny diela o 17,24 %,
- 2) stavebné práce sú realizované na ploche národnej kultúrnej pamiatky, evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu; kvýkopovým prácam bol prizvaný Krajský pamiatkový úrad v Trnave, na základe požiadaviek ktorého bolo nevyhnutné pristúpiť k istým úpravám v realizácii diela, čo si vyžiadalo dopracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu navyiac prác,
- 3) na objekte SO 01 v období od septembra 2021 do decembra 2021 a na objekte SO 02 od februára 2023 do marca 2023 prebiehal archeologický výskum, ktorý obmedzil plynulý priebeh realizácie stavebných prác.

Tento Dodatok č. 4 sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) ZVO, nakoľko predĺžením lehoty realizácie diela z pôvodných 18 mesiacov o šesť týždňov, teda do 30.04.2023, nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy. Táto zmena zmluvy nemení podmienky pôvodne realizovaného verejného obstarávania takým spôsobom, ktorý by mal vplyv na rozhodovanie hospodárskych subjektov ohľadne účasti vo verejnom obstarávaní, pretože:

- v súťažných podkladoch k verejnému obstarávaniu boli uchádzači/záujemcovia upozornení na skutočnosť, že stavebné práce budú realizované na ploche národnej kultúrnej pamiatky a že sa úspešný uchádzač bude musieť riadiť závermi a odporúčaniami Krajského pamiatkového úradu v Trnave, čo predpokladalo potenciálnu zmenu zmluvy, resp. predĺženie realizácie diela v prípade napr. realizácie archeologického výskumu, objavenia archeologického náleziska a pod.,

- dochádza vo vzťahu k objemu realizovaných prác navyiac o zanedbateľné predĺženie lehoty realizácie,

- bod 2.4 Zmluvy o dielo (zmluva bola súčasťou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu) pripúšťa možnosť primeraného predĺženia lehoty realizácie diela (okrem iného) aj

1. po dobu, kedy zhotoviteľ nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli výlučne na strane objednávateľa,
2. v prípade zmluvnými stranami odsúhlasených prác navyiac,
3. z dôvodu rozhodnutia tretích strán - v tomto prípade Krajského pamiatkového úradu v Trnave.

1. Predmet Dodatku č. 4

1.1 Predmetom Dodatku č. 4 je predĺženie lehoty realizácie diela.

1.2 Pôvodné znenie bodu 2.3 Zmluvy sa nahrádza nasledujúcim znením:

Zhotoviteľ sa zaväzuje **dokončiť dielo do 30.04.2023** (vrátane predloženia konečnej faktúry).

1.3 V bode 13.8 Zmluvy sa pôvodná príloha č. 3 Záväzný vecný, časový a finančný harmonogram realizácie diela ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa aktualizovaným Záväzným vecným, časovým a finančným harmonogramom realizácie diela, ktorý tvorí prílohu Dodatku č. 4 a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

1.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú Dodatkom č. 4 nedotknuté.

2. Záverečné ustanovenia

2.1 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom Dodatku č. 4, ktorý bol spísaný na základe pravdivých údajov a ich slobodnej vôle a nebol uzatvorený v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si Dodatok č. 4 prečítali a na znak súhlasu ho podpisujú.

2.2 V prípade, že akékoľvek ustanovenie Dodatku č. 4 je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť

ostatných ustanovení Dodatku č. 4, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, samotná povaha takéhoto ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení Dodatku č. 4 je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli zmluvných strán v čase uzatvorenia dodatku. Do uzatvorenia takého ďalšieho dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

- 2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek právne vzťahy spojené s Dodatkom č. 4, jeho výklad a aplikácia sa spravujú rovnakým rozhodným právom ako Zmluva. Príslušnosť na riešenie akýchkoľvek sporov podľa Dodatku č. 4 je daná rovnako, ako pre Zmluvu.
- 2.4 Dodatok č. 4 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 2.5 Dodatok č. 4 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise obdrží objednávatel' 3 rovnopisy a zhotoviteľ 2 rovnopisy.
- 2.6 Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Štatutárne orgány zmluvných strán podpisom Dodatku č. 4 vyjadrujú svoj súhlas s jeho zverejnením v plnom rozsahu.

V Trnave dňa 20. 03. 2023

V Prešove dňa 15 -03- 2023

Za objednávateľa:


**TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZNA
CHARITA**
-2- Hlavná 43, 917 01 Trnava

.....
Ing. Miroslav Dzurech, riaditeľ
Trnavská arcidiecézna charita

Za zhotoviteľa:


DAG SLOVAKIA, a.s.
Vojvodinská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021 IČDPH: SK2022657749

.....
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.


Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci cloveku Trnava

DAG Slovakia a.s.



Datum zadania:

1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	5. týždeň	6. týždeň	7. týždeň	8. týždeň	9. týždeň	10. týždeň	11. týždeň	12. týždeň	13. týždeň	14. týždeň	15. týždeň	16. týždeň
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

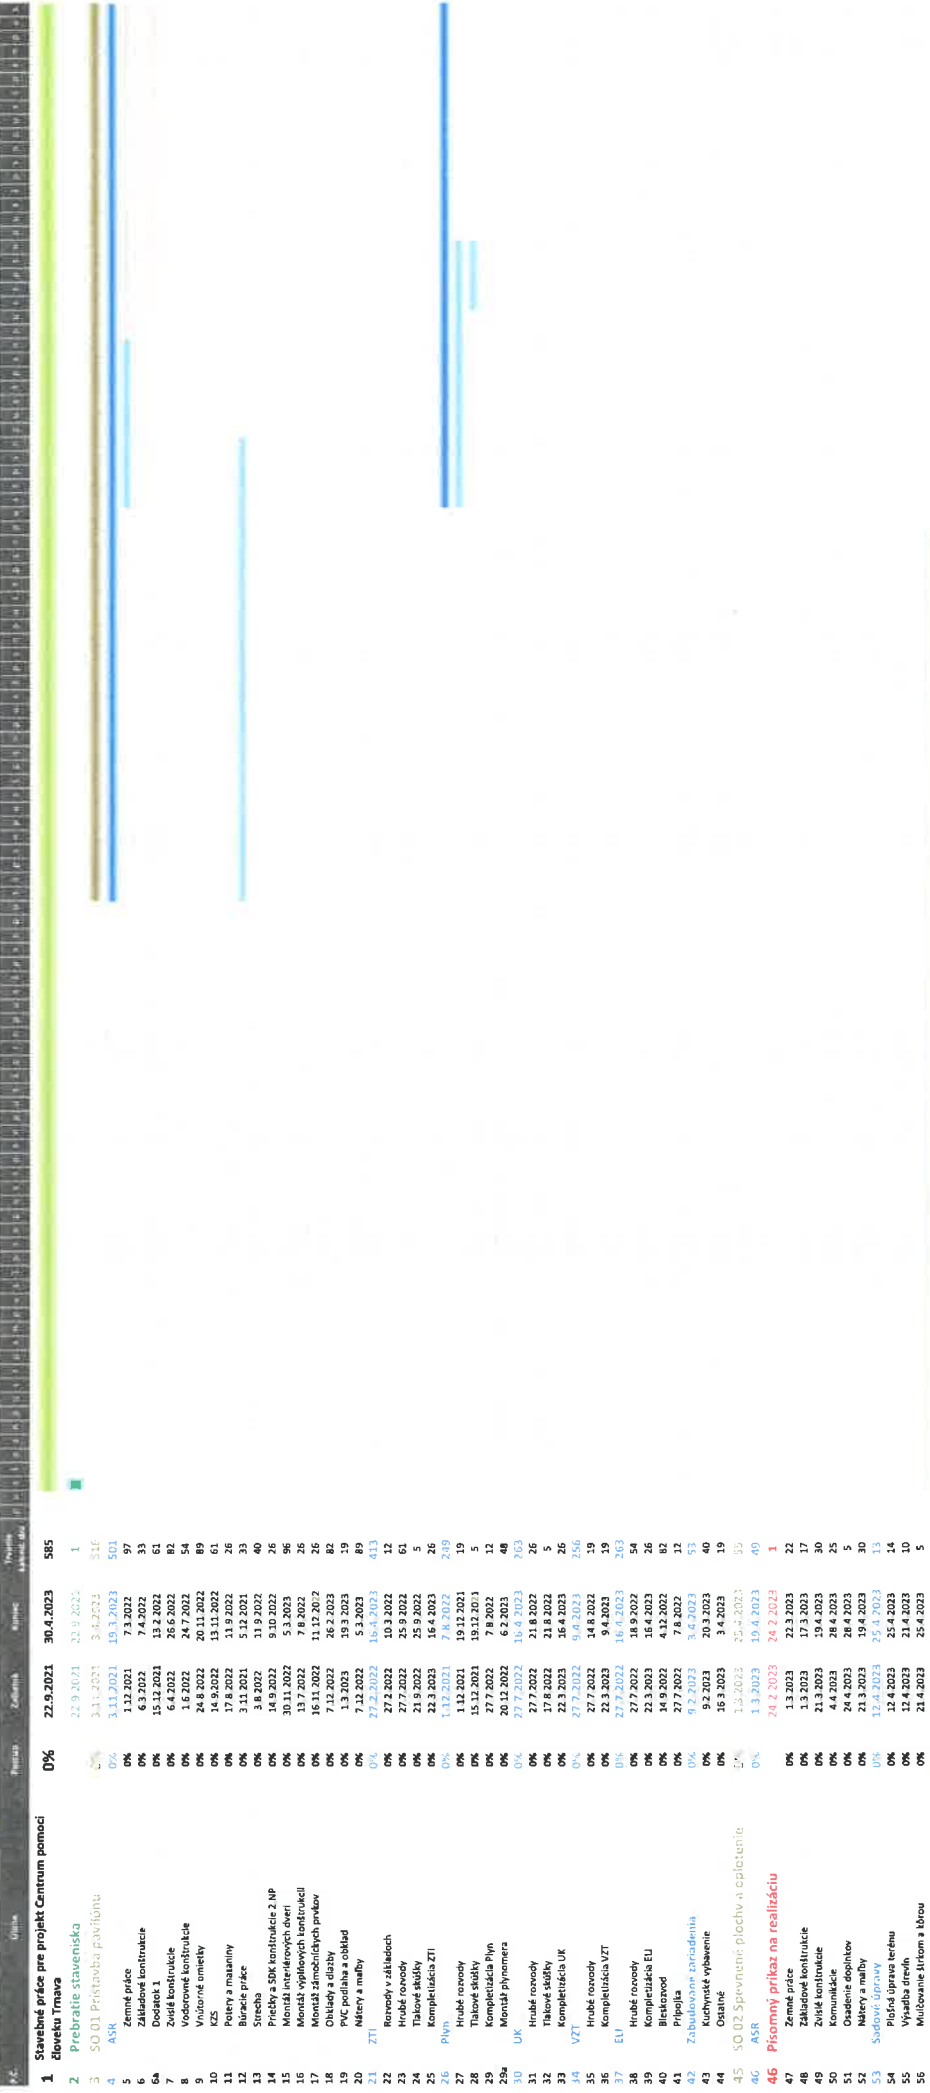

№	Uloha	0%	22.9.2021	30.4.2023	585
1	Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci cloveku Trnava	0%	22.9.2021	30.4.2023	585
2	Prebratie staviska	0%	3.11.2021	3.11.2021	316
3	SO 01 Príkazná pavilónu	0%	3.11.2021	19.3.2023	501
4	ASR	0%	1.12.2021	7.3.2022	97
5	Zemné práce	0%	6.3.2022	7.4.2022	33
6	Základové konštrukcie	0%	15.12.2021	13.2.2022	61
6a	Dielňota 1	0%	6.4.2022	26.6.2022	82
7	Vodovodné konštrukcie	0%	1.6.2022	24.7.2022	54
8	Kanalizačné inštalácie	0%	24.8.2022	30.11.2022	59
9	Pletky a maliny	0%	17.8.2022	11.9.2022	26
10	Strecha	0%	3.11.2021	5.12.2021	33
11	Príčky a SDK konštrukcie 2. NP	0%	3.8.2022	11.9.2022	40
12	Montáž interiérových dverí	0%	14.9.2022	9.10.2022	26
13	Montáž výplňových konštrukcií	0%	30.11.2022	5.3.2023	96
14	Montáž sčrmočíchových prvkov	0%	13.7.2022	7.8.2022	26
15	Odtoky a dlaty	0%	16.11.2022	11.12.2022	26
16	PVC podlaha a obklad	0%	7.12.2022	26.2.2023	82
17	Mikry a malby	0%	1.3.2023	19.3.2023	19
18	Revoly v základoch	0%	12.12.2022	9.3.2023	613
19	Hrubé rozvody	0%	27.7.2022	10.3.2022	12
20	Tlakové skúšky	0%	27.7.2022	25.9.2022	61
21	Kompleťácia ZTI	0%	21.9.2022	25.9.2022	5
22	Hrubé rozvody	0%	22.3.2023	16.4.2023	26
23	Tlakové skúšky	0%	1.12.2021	19.12.2021	19
24	Kompleťácia Plyn	0%	15.12.2021	19.12.2021	5
25	Montáž plynomera	0%	20.12.2022	16.2.2023	48
26	Hrubé rozvody	0%	27.7.2022	18.6.2023	503
27	Tlakové skúšky	0%	17.8.2022	21.8.2022	58
28	Kompleťácia UK	0%	22.3.2023	16.4.2023	26
29	Kompleťácia VZ	0%	27.7.2022	14.8.2022	19
30	Hrubé rozvody	0%	22.3.2023	9.4.2023	19
31	Tlakové skúšky	0%	27.7.2022	16.4.2023	263
32	Kompleťácia EU	0%	22.3.2023	16.4.2023	26
33	Biacozvod	0%	14.9.2022	4.12.2022	82
34	Prípaja	0%	27.7.2022	7.8.2022	12
35	Základové konštrukcie	0%	9.2.2023	20.3.2023	40
36	Kuchynská výbava	0%	16.3.2023	3.4.2023	19
37	Osadenie	0%	15.2.2023	26.3.2023	84
38	Zemné práce	0%	1.3.2023	19.4.2023	69
39	Základové konštrukcie	0%	1.3.2023	22.3.2023	22
40	Dielňota 1	0%	17.3.2023	17.3.2023	17
41	Osdzenie dlebníkov	0%	29.4.2023	28.4.2023	25
42	Mikry a malby	0%	4.4.2023	28.4.2023	35
43	Sadové úpravy	0%	29.4.2023	28.4.2023	5
44	Plošná úprava terénu	0%	21.3.2023	19.4.2023	30
45	Výsadba drevín	0%	12.4.2023	25.4.2023	13
46	Mulčovanie lôžkom a lôžou	0%	12.4.2023	25.4.2023	14
47	Demolícia existujúcich objektov	0%	12.4.2023	21.4.2023	10
48	Demolícia vrchnej stavy	0%	21.4.2023	25.4.2023	5
49	Demolícia spodnej stavy	0%	22.9.2021	28.11.2021	67
50	Funkčné skúšky	0%	27.9.2021	7.11.2021	47
51	Likvidácia staviska	0%	3.11.2021	28.11.2021	26
52	Odvodnenie stavy a ukončenie prác	0%	19.1.2022	23.4.2022	5
53		0%	28.4.2023	30.4.2023	3
54		0%	10.4.2023	10.4.2023	1

Legenda

- Práca, preláthy v prácach,
- Príkazný príkaz na realizáciu objeťtia
- Mikry stavy
- Súhny celj stavy
- Súhny úloh
- Úloha

Poznámky

- Harmonogram nezohľadňuje obmedzenia zapríčinené pracou archeológov a pamiatkárov
- Harmonogram nezohľadňuje nepriaznivé klimatické podmienky počas prác na spovených plochách a sadových úpravách



Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci človeku Trn

DAG SLOVAKIA a.s.



Dátum zadania:



Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci	0%	22.9.2021	30.4.2023	585
1. Zlovenka Trnava	0%	22.9.2021	30.4.2023	585
2. Prebratie staviebka	0%	22.9.2021	30.4.2023	1
3. SO 01 Prístavba pavilónu	0%	3.11.2021	9.4.2023	915
4. ASR	0%	3.11.2021	19.3.2023	501
5. Zemné práce	0%	1.12.2021	7.3.2022	97
6. Základové kontrukcie	0%	6.3.2022	7.4.2022	33
6a. Dodatok 1	0%	15.12.2021	13.2.2022	61
7. Zvlk kontrukcie	0%	6.4.2022	16.9.2022	82
8. Vykopávacie kontrukcie	0%	20.10.2021	2.11.2021	94
9. Vykopávacie zemná	0%	24.8.2021	20.11.2021	98
10. KZS	0%	14.9.2022	13.11.2022	61
11. Prázy a mazinny	0%	17.8.2022	11.9.2022	26
12. Buracie práce	0%	3.11.2021	5.12.2021	33
13. Strecha	0%	3.8.2022	11.9.2022	40
14. Príchy a žm, kontrukcie z HP	0%	14.9.2022	9.10.2022	26
15. Montáž interierových dverí	0%	30.11.2021	5.3.2023	96
16. Montáž výplňových kontrukcií	0%	13.7.2022	7.8.2022	26
17. Montáž zámočkových prvkov	0%	16.11.2022	11.12.2022	26
18. Ošatení a dlahy	0%	7.12.2022	26.2.2023	82
19. PVC podlaha a osádka	0%	1.3.2023	19.3.2023	19
20. Malby a omietky	0%	1.3.2023	19.3.2023	19
21. ZTI	0%	27.2.2022	14.4.2023	413
22. Revoly v základoch	0%	27.2.2022	10.3.2022	12
23. Hrubé revoly	0%	27.7.2022	25.9.2022	61
24. Tlakové skúšky	0%	21.9.2022	25.9.2022	5
25. Kompletácia ZTI	0%	22.3.2023	16.4.2023	26
26. Plyn	0%	1.12.2021	7.8.2022	249
27. Hrubé revoly	0%	1.12.2021	19.12.2021	19
28. Tlakové skúšky	0%	15.12.2021	19.12.2021	5
29. Kompletácia Plyn	0%	27.7.2022	7.8.2022	12
29a. Montáž Plyn	0%	20.12.2022	6.2.2023	48
30. Montáž Plyn	0%	20.12.2022	6.2.2023	48
31. Hrubé revoly	0%	27.7.2022	21.8.2022	16
32. Tlakové skúšky	0%	17.8.2022	21.8.2022	5
33. Kompletácia UK	0%	23.3.2023	16.4.2023	26
34. VZT	0%	27.7.2022	9.4.2023	256
35. Hrubé revoly	0%	27.7.2022	14.8.2022	19
36. Kompletácia VZT	0%	22.3.2023	9.4.2023	19
37. EU	0%	27.7.2022	16.4.2023	263
38. Hrubé revoly	0%	27.7.2022	18.9.2022	54
39. Kompletácia EU	0%	22.3.2023	16.4.2023	26
40. Biostrop	0%	14.9.2022	4.12.2022	82
41. Nipolpa	0%	14.9.2022	7.8.2022	52
42. Zvlk kontrukcie	0%	15.2.2023	7.8.2023	53
43. Kuchynské vybavenie	0%	9.2.2023	20.3.2023	40
44. Ostatné	0%	16.3.2023	3.4.2023	19
45. SO 02 Spojovacie plochy a eplotenr	0%	1.3.2023	26.4.2023	54
46. ASR	0%	1.3.2023	19.4.2023	49
47. Zemné práce	0%	24.2.2023	24.2.2023	1
48. Základové kontrukcie	0%	1.3.2023	22.3.2023	22
49. Zvlk kontrukcie	0%	21.3.2023	19.3.2023	30
50. Komunikácie	0%	4.4.2023	28.4.2023	25
51. Ozadenie doplnkov	0%	24.4.2023	28.4.2023	5
52. Nátany a maľby	0%	21.3.2023	19.4.2023	30
53. Súdovú úpravu	0%	12.6.2023	25.4.2023	13
54. Pískas úprava terénu	0%	12.6.2023	25.4.2023	14
55. Výsadb dreví	0%	12.4.2023	21.4.2023	10
56. Mulčovanie litum a kôru	0%	21.4.2023	25.4.2023	5
57. SO 03 Demolícia existujúcich objektov	0%	22.9.2021	18.11.2021	67
58. ASR	0%	22.9.2021	28.11.2021	67
59. Demolícia vrchnej stavby	0%	22.9.2021	7.11.2021	47
60. Demolícia spodnej stavby	0%	3.11.2021	4.11.2021	26
61. Funkčné skúšky	0%	19.4.2023	21.4.2023	5
62. Lividácia staviebka	0%	26.4.2023	30.4.2023	3
63. Odovzdanie stavby a ukončenie prác	0%	30.4.2023	30.4.2023	1

- Legenda**
- Pretože, prelásky v prácach,
 - Písomný príkaz na realizáciu oploenia
 - Mlnky stavby
 - Súhm celej stavby
 - Súhm úloh
 - Úloha

Poznámky


- Harmonogram nezohľadňuje obmedzenia zapríčinené prátou arciteológov a pamiatkórov
- Harmonogram nezohľadňuje nepriaznivé klimatické podmienky počas prác na spevnených plochách a sadových úpravách



Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci človeku Trn

DAG Slovakia a.s.

Dátum zadania:

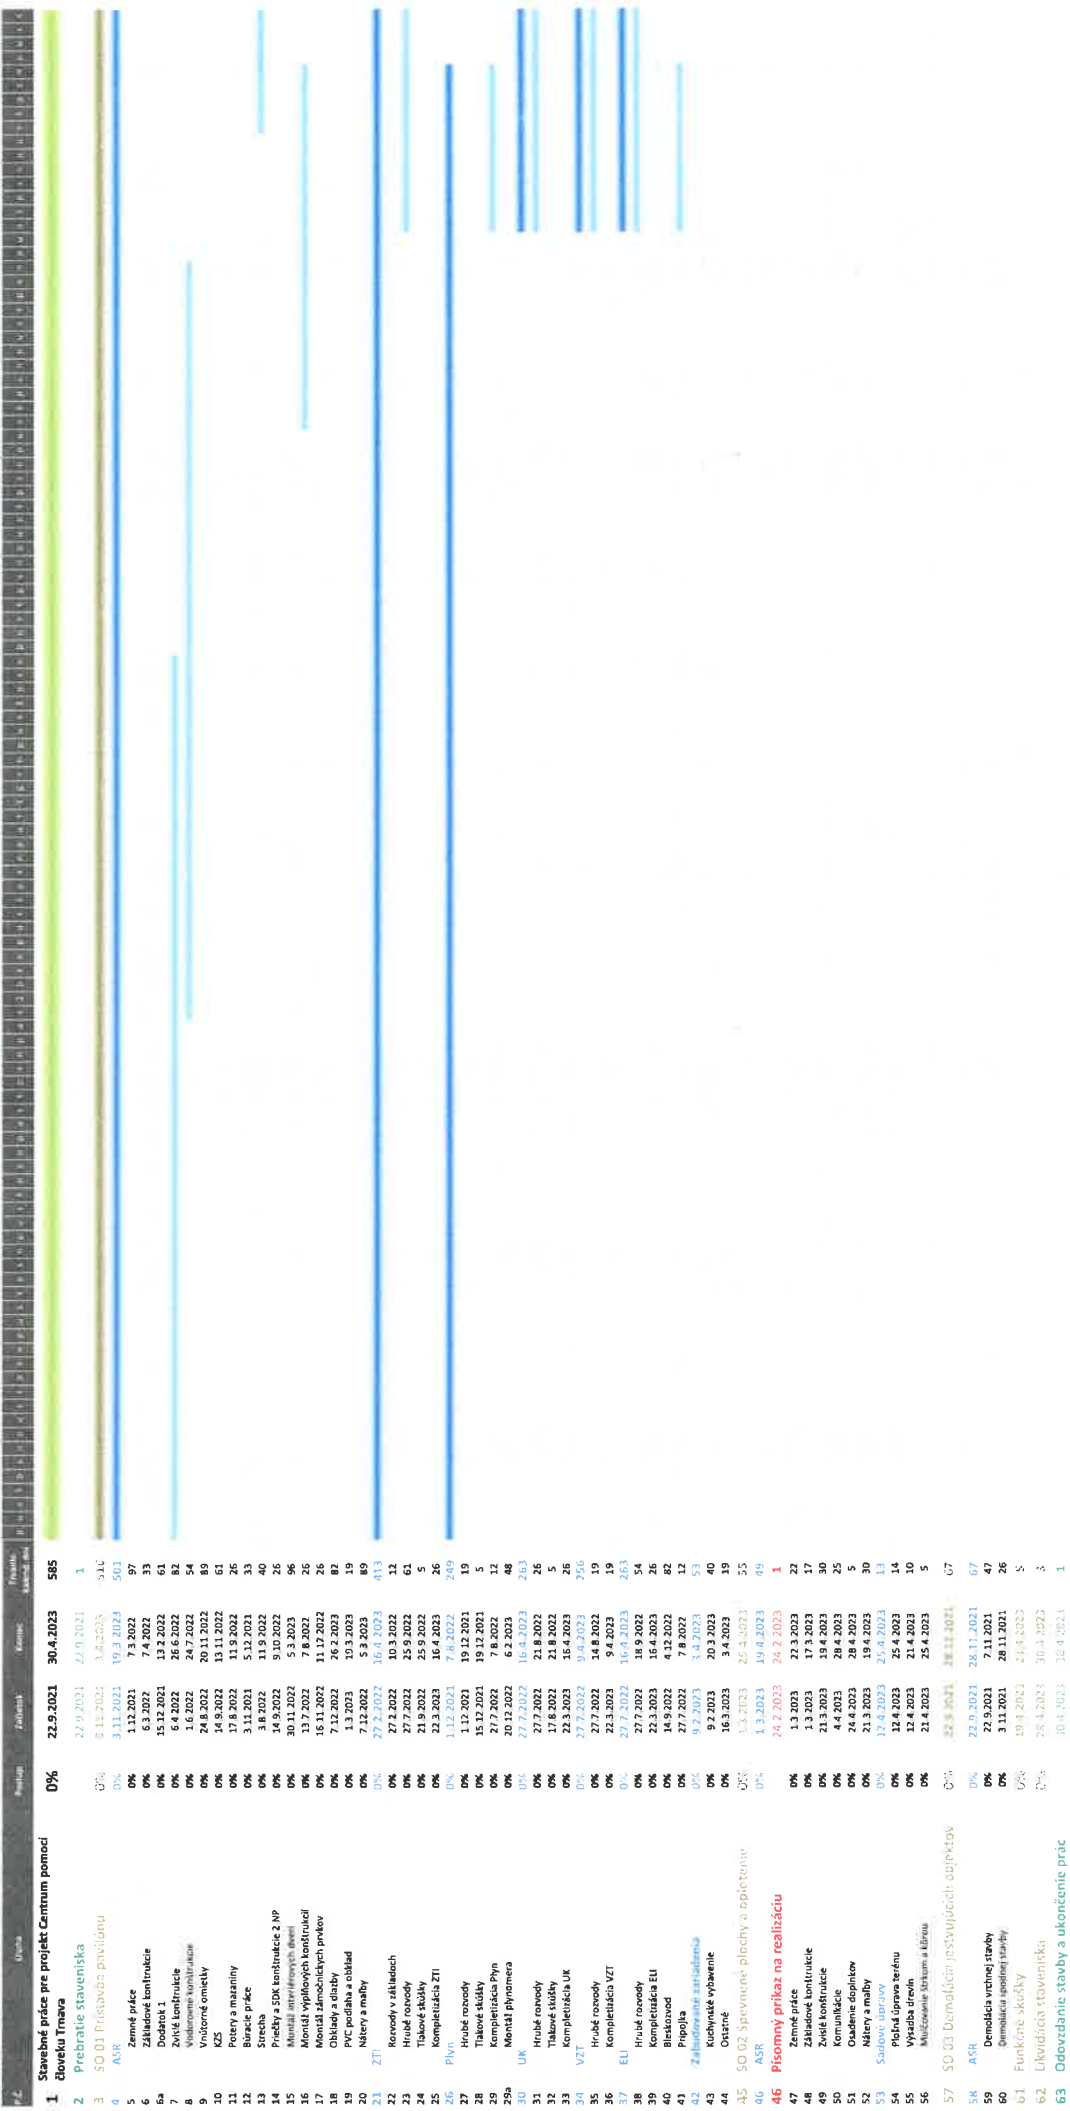

Legenda

- Prestoje, prekážky v práciach
- Písomný príkaz na realizáciu oplnenia
- Mletý a mletý
- Súhrn celej stavby
- Súhrn úloh
- Úloha


Prílohy

- Harmonogram nezhodujúceho zapríčineného archeológov a pamiatkárkov
- Harmonogram nezhodujúceho nepriazniveho klimatickeho podmienky počas prác na spomenutých plochách a sadových úpravách



Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci človeku Trn

DAG Slovakia a.s.

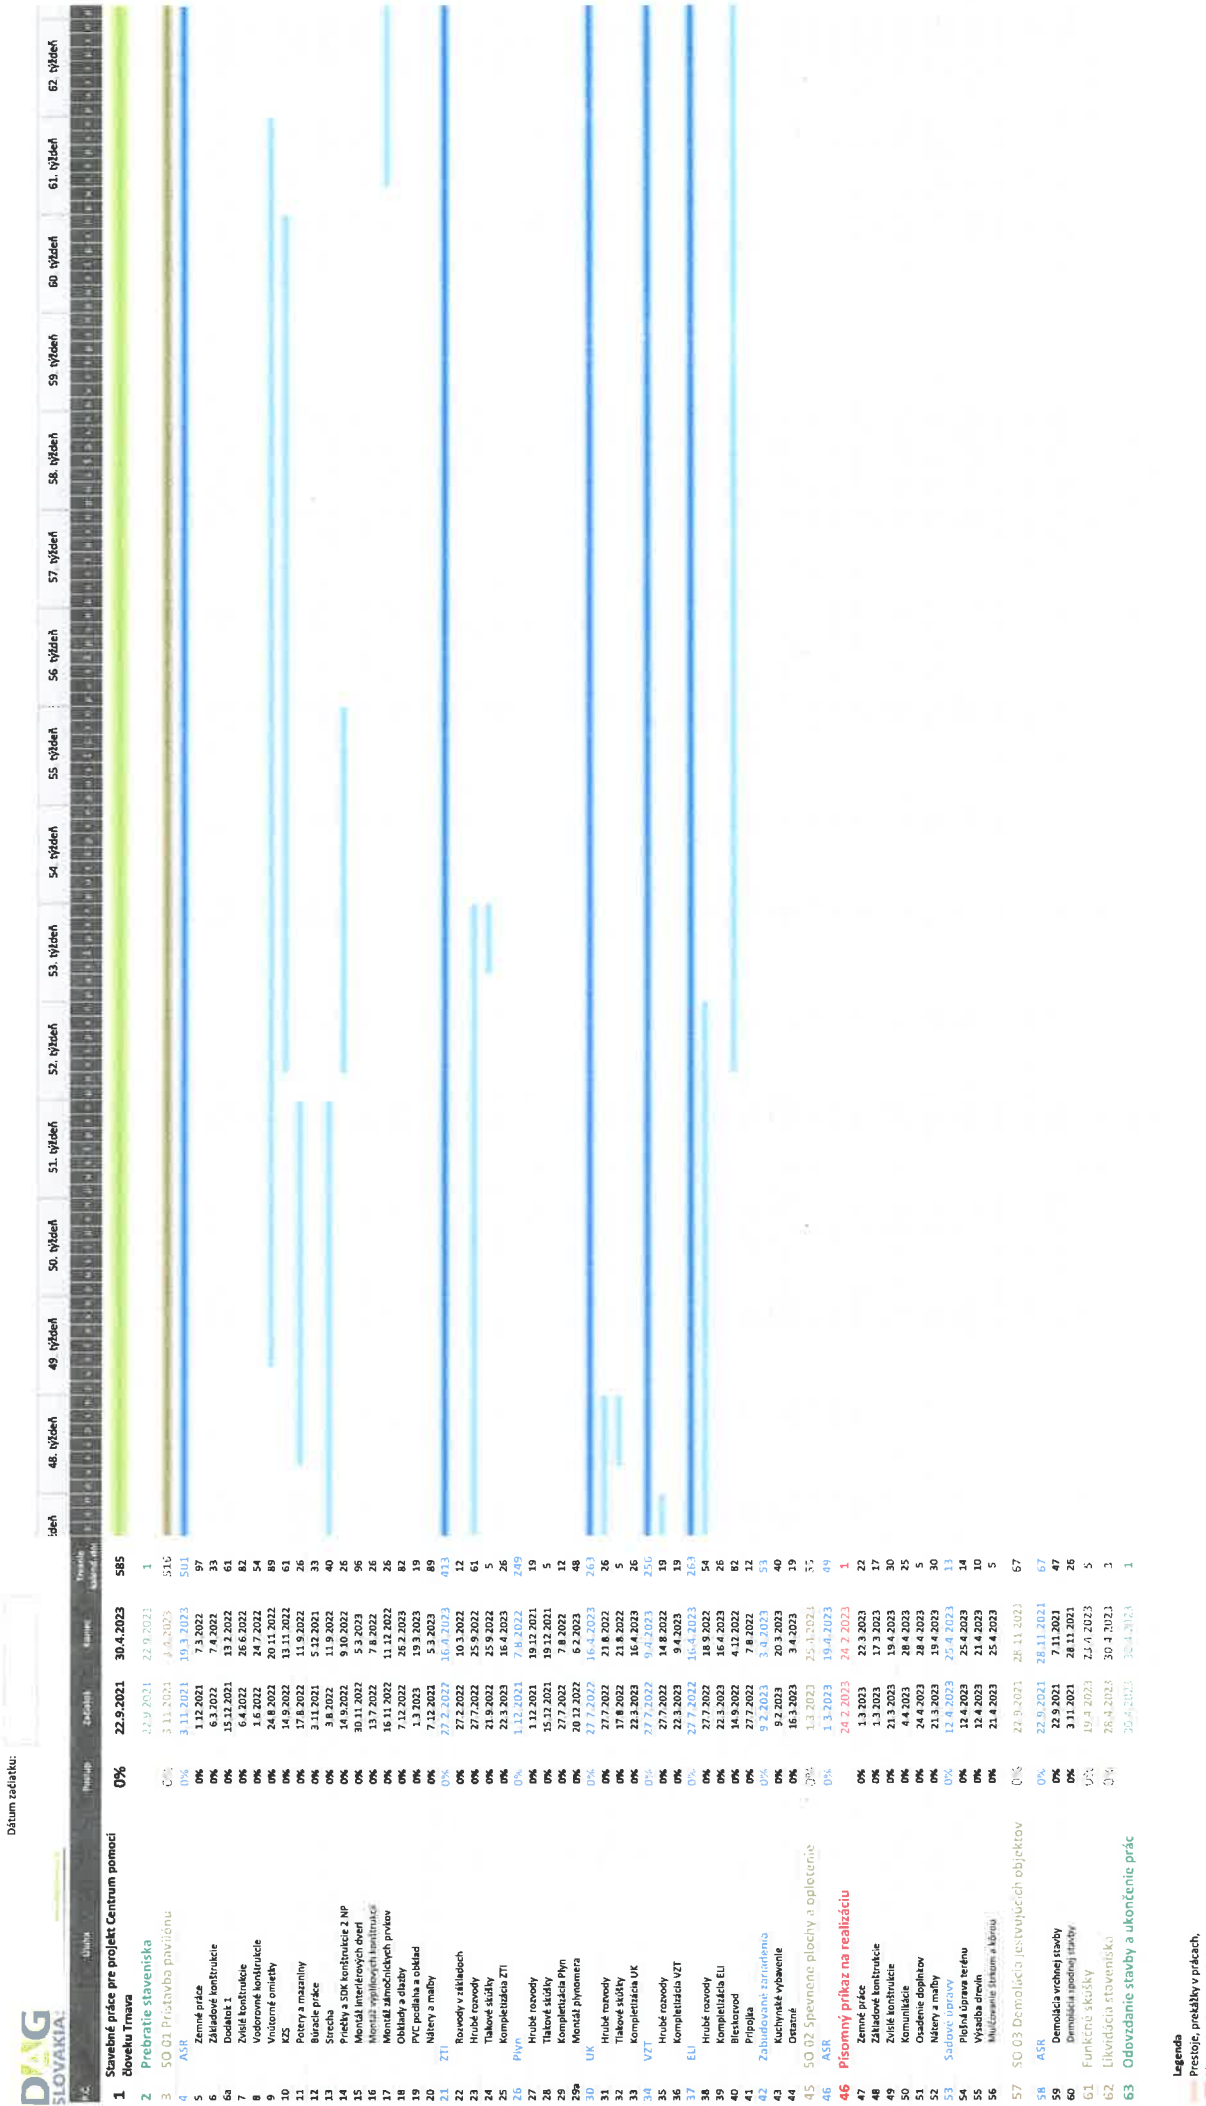


- Legenda**
- Prestroje, prebätby v prácach,
 - Pilotomný príkaz na realizáciu oploštenia
 - Mlynky stavby
 - Súhrn celej stavby
 - Súhrny úloh
 - Úloha
- Poznámky**
- Harmonogram nezohľadňuje obmedzenia zapríčinené prácou archeológov a pamiatkárov
 - Harmonogram nezohľadňuje nepriaznivé klimatické podmienky počas prác na spevnených plochách a sadových úpravách

Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci človeku Trn

DAG SLOVAKIA a.s.

Datum zadania:

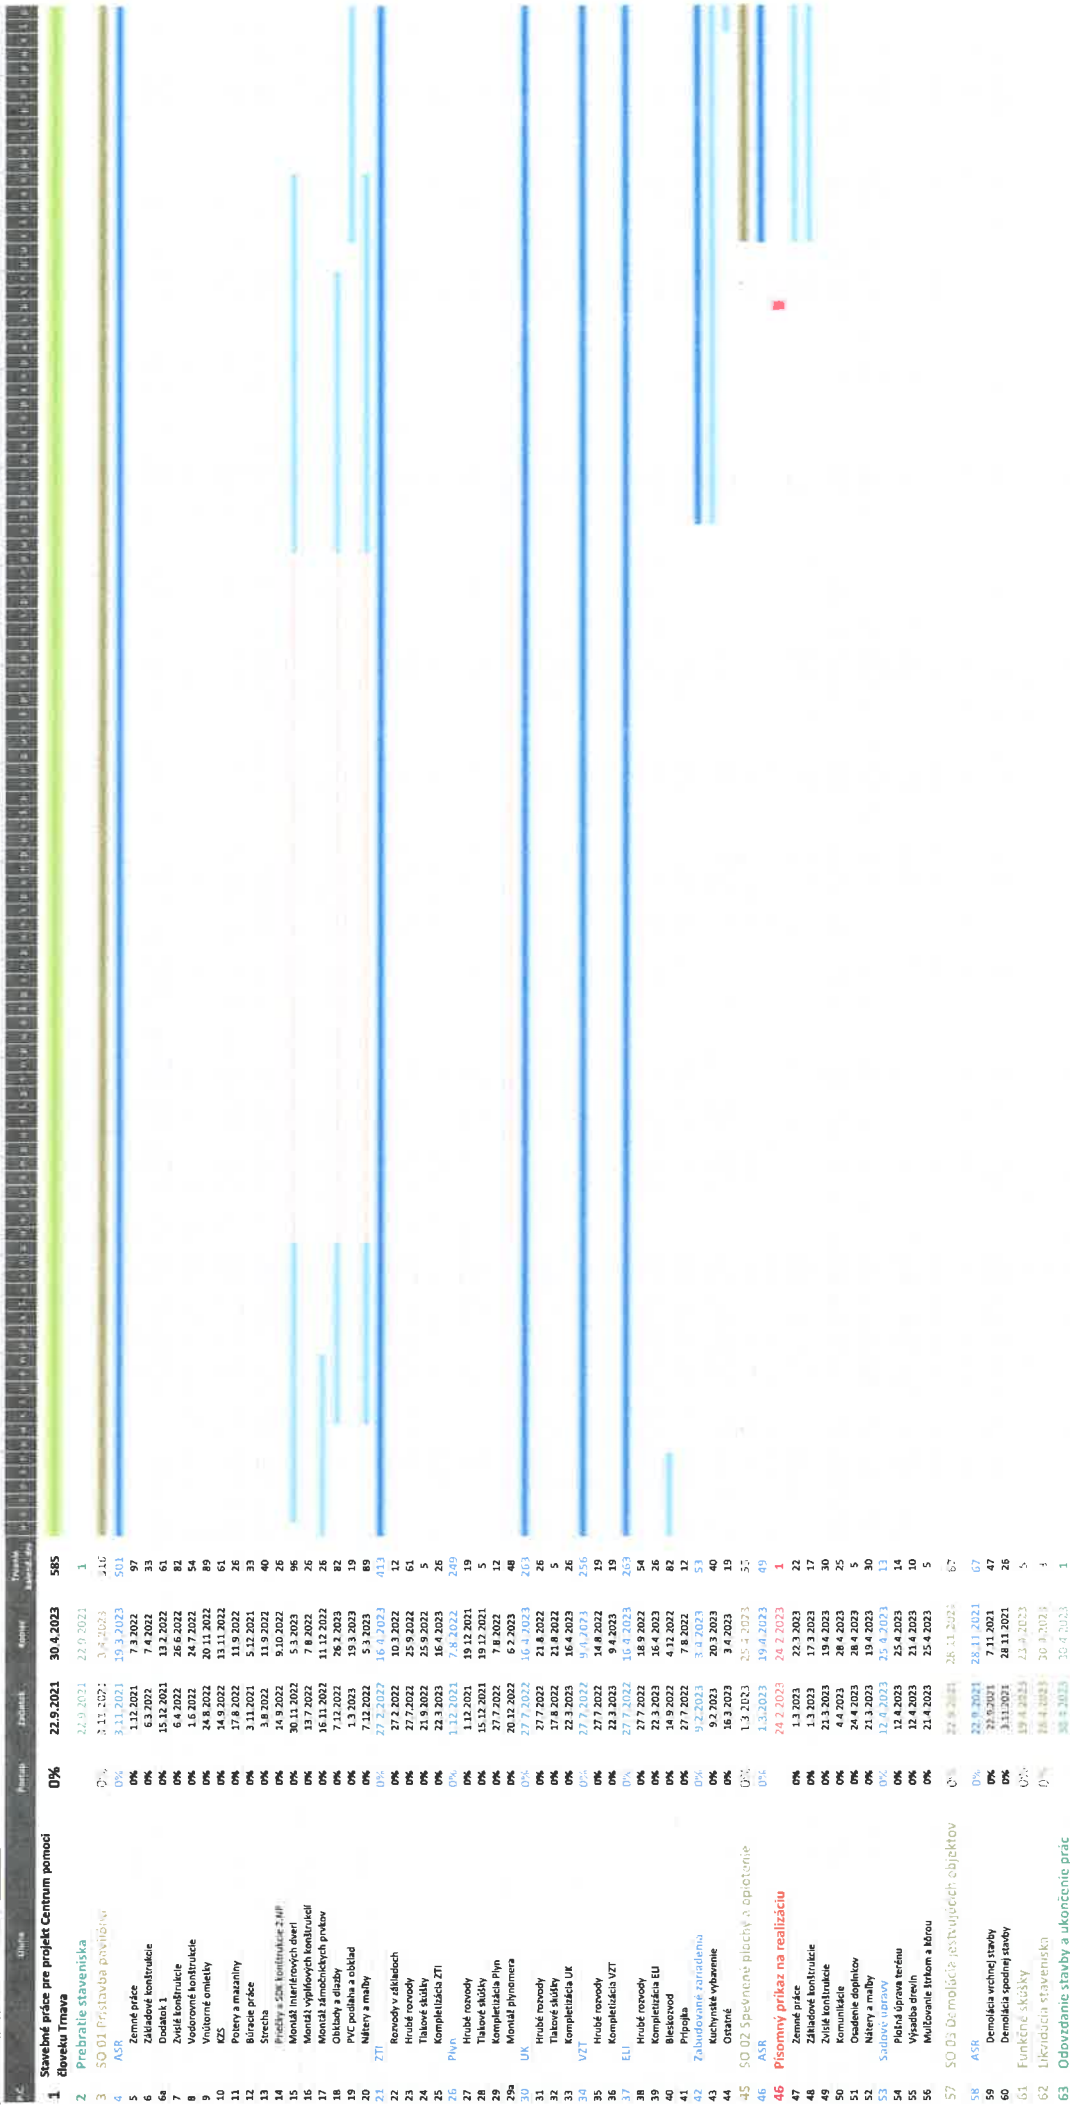

- Legenda**
- Presoje, prekážky v práciach,
 - Pisomný prikaz na realizáciu opietenia
 - Mifný stavby
 - Subny celej stavby
 - Subny úloh
 - Uloha
- Poznámky**
- Harmonogram nezohľadňuje obmedzenia oprídnené prarochológov a pamiatkárrov
 - Harmonogram nezohľadňuje nepriaznivé klimatické podmienky počas prác na sporných plochách a stavbých úpravách



Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci cloveku Trn

DAG Slovakia a.s.



№	Uloha	Priloha	Začiatok	Koniec	Trvanie (týždne)	Stav	Dátum zadania:
1	Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci cloveku Trnava		22.9.2021	30.4.2023	585	0%	
2	Preprava stavebniska		22.9.2021	22.9.2021	1	0%	
3	SO 01 Prístavba pavilónu		3.11.2021	3.4.2023	516	0%	
4	ASR		3.11.2021	19.3.2023	501	0%	
5	Zemné práce		1.12.2021	7.3.2022	39	0%	
6a	Základové konštrukcie		6.3.2022	7.4.2022	31	0%	
7	Dobrotok 1		15.12.2021	13.2.2022	61	0%	
8	Zväčšenie konštrukcie		6.4.2022	26.6.2022	82	0%	
9	Výstavba kumbálavice		1.6.2022	28.7.2022	54	0%	
10	Výstavba omietky		14.8.2022	11.10.2022	61	0%	
11	KZ		14.8.2022	13.11.2022	61	0%	
12	Preruby a mažiny		17.8.2022	11.9.2022	26	0%	
13	Búrocie práce		3.11.2021	5.11.2021	33	0%	
14	Strecha		8.8.2022	11.9.2022	40	0%	
15	Plochy a POK kumbálavice 2.NP		14.9.2022	9.10.2022	26	0%	
16	Montáž interiérových dverí		30.11.2022	5.3.2023	96	0%	
17	Montáž výplňových konštrukcií		13.7.2022	7.8.2022	26	0%	
18	Montáž zámočkových prvkov		16.11.2022	11.12.2022	26	0%	
19	Obklady a dlažby		7.12.2022	26.2.2023	82	0%	
20	PVC podlaha a ošklad		1.3.2023	19.3.2023	19	0%	
21	Nátery a maľby		12.2.2022	3.3.2023	413	0%	
22	ZTI		27.2.2022	10.3.2022	12	0%	
23	Rozvody v stĺbkoch		27.2.2022	25.9.2022	61	0%	
24	Trubové skúšky		21.9.2022	25.9.2022	5	0%	
25	Kompletizácia ZTI		23.3.2023	16.4.2023	26	0%	
26	Plyn		1.12.2021	7.8.2022	249	0%	
27	Hrubé rozvody		1.12.2021	19.12.2021	19	0%	
28	Tlakové skúšky		15.12.2021	19.12.2021	5	0%	
29	Kompletizácia Plyn		27.7.2022	7.8.2022	12	0%	
29a	Montáž plynomera		20.11.2022	6.2.2023	48	0%	
30	UK		17.9.2022	16.8.2023	283	0%	
31	Hrubé rozvody		17.9.2022	14.8.2022	6	0%	
32	Tlakové skúšky		11.8.2022	21.8.2022	5	0%	
33	Kompletizácia UK		23.3.2023	16.4.2023	26	0%	
34	VZT		27.7.2022	9.4.2023	256	0%	
35	Hrubé rozvody		27.7.2022	14.4.2022	19	0%	
36	Kompletizácia VZT		23.3.2023	9.4.2023	19	0%	
37	EU		27.7.2022	16.4.2023	263	0%	
38	Hrubé rozvody		27.7.2022	18.9.2022	26	0%	
39	Kompletizácia EU		23.3.2023	16.4.2023	26	0%	
40	Bleskovod		14.9.2022	4.12.2022	82	0%	
41	Pripojba		27.7.2022	18.9.2022	12	0%	
42	Kuchynské vybavenie		9.2.2023	20.3.2023	40	0%	
43	Kuchynské vybavenie		16.3.2023	3.4.2023	19	0%	
44	Osadené		1.3.2023	25.6.2023	55	0%	
45	SO 02 Spravenie plochy a oplatenie		1.3.2023	19.4.2023	40	0%	
46	ASR		24.2.2023	24.2.2023	1	0%	
47	Pisomny prikaz na realizáciu		1.3.2023	23.3.2023	22	0%	
48	Zemné práce		1.3.2023	19.3.2023	17	0%	
49	Základové konštrukcie		2.4.2023	19.3.2023	30	0%	
50	Kompletizácia		4.4.2023	28.4.2023	25	0%	
51	Osadenie dverí		24.4.2023	28.4.2023	5	0%	
52	Nátery a maľby		21.3.2023	19.4.2023	30	0%	
53	Štádové úpravy		12.4.2023	25.4.2023	13	0%	
54	Plná úprava terénu		12.4.2023	25.4.2023	14	0%	
55	Výsadba drevín		12.4.2023	21.4.2023	10	0%	
56	Mulčovanie listím a kôrou		21.4.2023	25.4.2023	5	0%	
57	SO 03 Demolícia existujúcich objektov		23.9.2021	28.11.2021	67	0%	
58	ASR		22.9.2021	28.11.2021	67	0%	
59	Demolícia vrchnej stavy		22.9.2021	7.11.2021	47	0%	
60	Demolícia spodnej stavy		3.11.2021	28.11.2021	26	0%	
61	Funkčné skúšky		19.4.2023	23.4.2023	5	0%	
62	Likvidácia stavebniska		28.4.2023	30.4.2023	3	0%	
63	Odoslanie stavby a ukončenie prác		30.4.2023	30.4.2023	1	0%	

- Legenda**
- Pretože, prekážky v práciach,
 - Pisomny prikaz na realizáciu oplatenia
 - Mifny stavby
 - Súhrn celých stavby
 - Súhrn úloh
 - Úloha
- Poznámky**
- Harmonogram nezohľadňuje obmedzenia zapríčinené prácou archeológov a pamiatárov
 - Harmonogram nezohľadňuje nepriaznivé klimatické podmienky počas prác na spevnených plochách a sadových úpravách

DAG SLOVAKIA, a.s.
 Volgogradská 9, 080 01 Prešov
 IČO: 44 886 021 | IČDPH: SK202257749

ING. TOMÁŠ SALOKY



